


5. 生产区域平面布置情况:

站前架空电力线, 通信线到加油机: 11.2m

同用架空电力线到1#加油机: 15m 到2#加油机: 17.4m

生产区域平面布置示意图

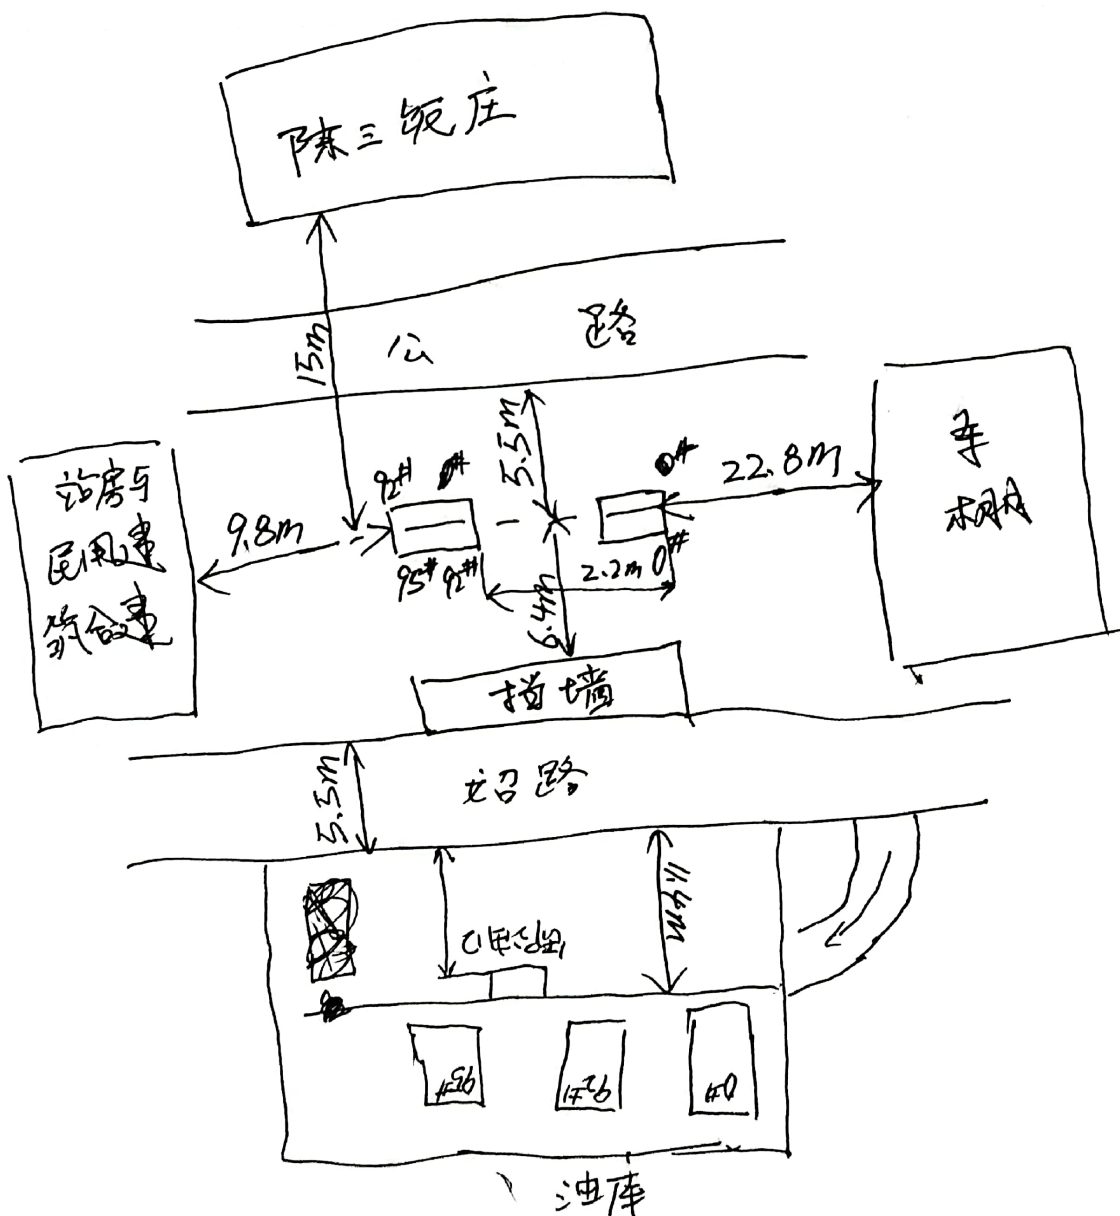

通气管到围墙: 16.8m

油罐到围墙: 13.4m

通气管到民房(与站房合建): 26.4m

油管到民房(与站房合建): 22.8m

卸油工具房到1#油罐操作井6.9m.

昭通市鼎安科技有限公司

安全生产工程技术服务现场检查整改建议书


项目(单位): 景东县花山加油站 项目类型: _____

法定代表人(负责人) _____ 联系电话: _____ 日期: _____

现场发现的问题及建议:

1. 92#加油枪手柄皮套颜色与油品类型不对, 油品标识不清.
2. 油罐落运气管无油品标识;
3. 油罐落操作井工艺管道无标识;
4. ^{柴油}加油机防爆接线盒未封堵.

委托方负责人:



现场检查人员:

李志刚 陆毅清

昭通市鼎安科技有限公司

2024年10月26日
